


丸子橋架設工事近況

竣工せる鐵筋混泥土拱部

東京府土木部橋梁課設計

株式會社高組施工

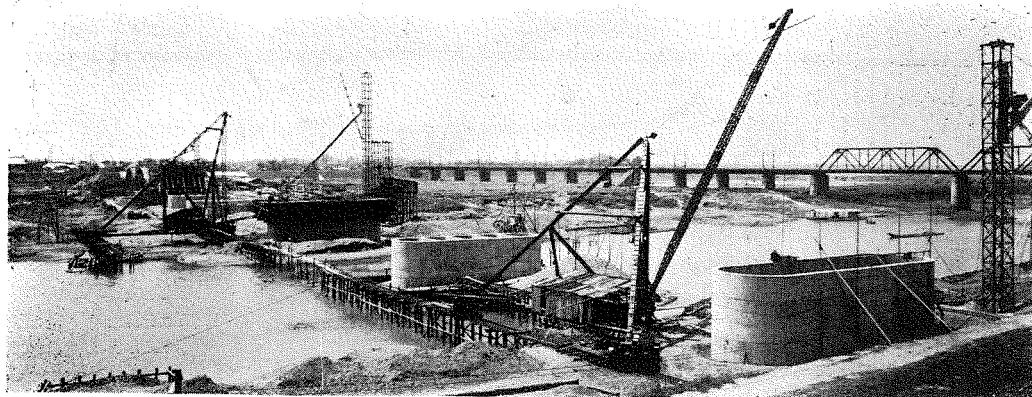

(1) 東京市寄堤上より見たる丸子橋作業場全景。

丸子橋架設工事概要

東京府土木部橋梁課長 杉山宗次郎

(1) 工事現況

本橋架設工事中現在起工したるは第一期工事として下部工事及上部工事中鐵筋混凝土拱橋の部分のみにして第二期工事として鋼繫拱橋の三徑間鐵部上部工事及橋面鋪裝工事は近々着工の豫定なるを以て此處に第一期工事の経過及現況を略記せんとす。

即ち第一期工事は鐵筋混凝土拱橋10徑間及鋼繫拱橋3徑間の下部工事にして、鐵筋混凝土拱は東京市寄に壹徑間を有し他は神奈川縣寄洪水數に9徑間を有し、基礎工事は兩橋臺共杭打基礎にして橋脚方一號より第六號に至る6基は井筒基礎橋脚、第七號より第拾貳號に至る6基は杭打基礎なり、上記の如き工事配置なるを以て杭打基礎は橋脚第七號より順を追ひ施工し井筒基礎は橋脚第六號より第一號に向ひ順次施工し、洪水敷作業及低水敷作業を平行完成すべく計畫施工に着手し、昭和七年九月着工以來満一ヶ年餘を経過したる今日低水敷作業としては橋脚第一號及第三號第五

號第六號井筒沈下を了し、橋脚第二號井筒沈下中にして近々沈下終了の見込み、橋脚第四號井筒約八米沈下未了の現状にして、橋脚第六號は軸體を立上り橋脚六號及七號間の上部工事に着手したり。洪水敷杭打基礎中神奈川縣寄橋臺を始め橋脚六基及鐵筋混凝土拱並に路床高欄等6徑間混凝土作業を終了し高欄の洗出仕上を一部残す状態にして、低水敷作業は基礎地盤堅硬なる爲め井筒沈下作業の遅延せる感あれ共第一期工事の混凝土總立積13,729.0立米中7,200.0立米を施工し鐵筋84.0噸の内560.0噸の加工組立を了し工程約60%の進捗を見たり(別圖一覽圖参照)

第一期工事は錢高組之を請負ひ昭和九年三月竣工の見込みなり。


(2) 工事用諸設備

井筒掘鑿沈下用設備

ステフレツグ型動臂起重機

木製1臺 動力 50馬力 電氣

鐵製1臺 同 50 同 同

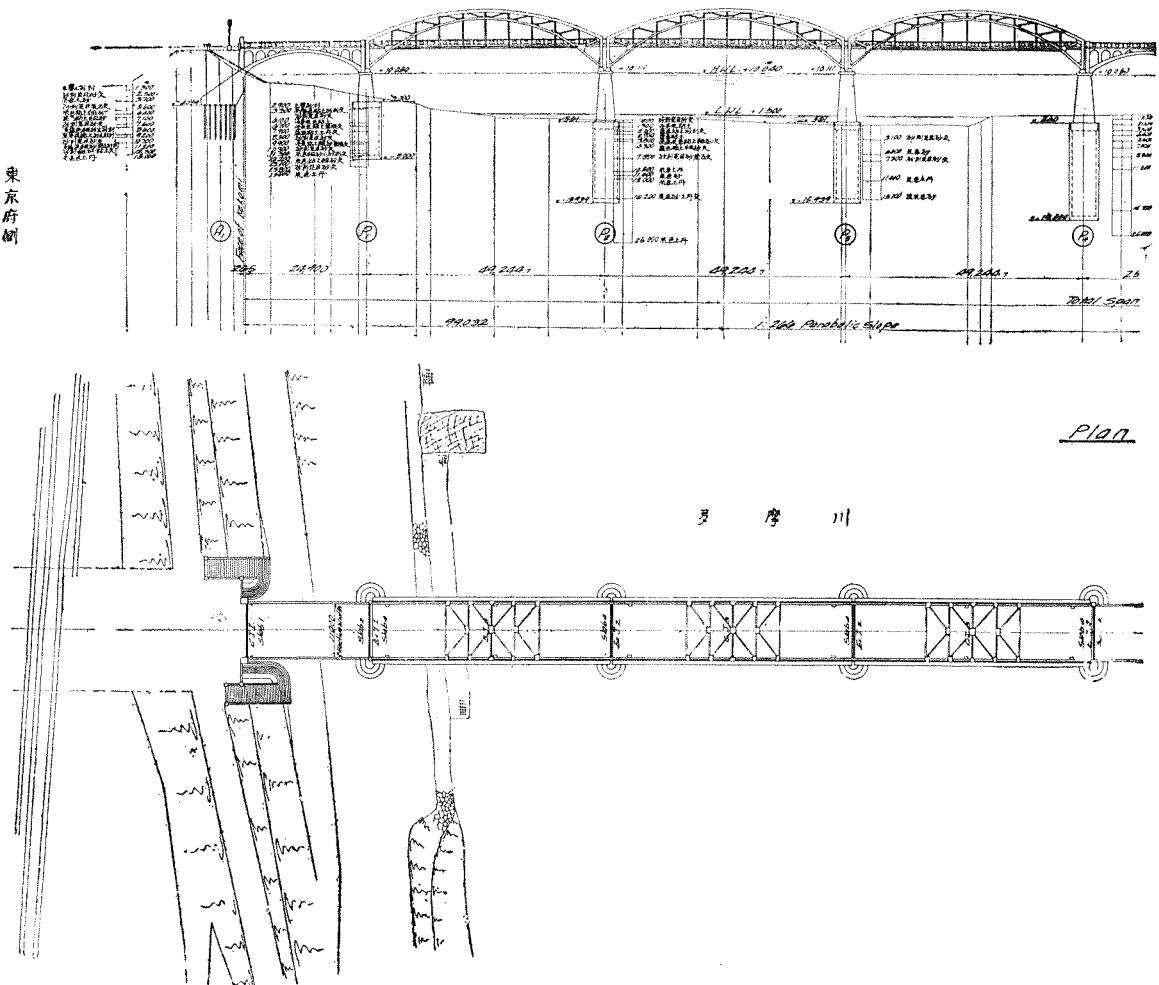

水替用

ターピンポンプ

6吋ホース3臺 動力 25馬力 電氣

同 4吋ホース2臺 同 15 同 同

ゼットポンプ

4吋ホース1臺 同 20 同 同

基礎杭打用設備 杭打は落下錐式

高さ30尺杭打ヤグラ

120 貫モンキー 15馬力ウインチ 同

混凝土打用設備

日本建機株式會社特許 動力 5馬力 同

ウォーセクリーター

14切圓筒型練合機 同 10 同 同

高さ60尺昇降塔 2本 10馬力ウインチ共

砂利及砂巻揚用

高さ105尺昇降塔 1本 15馬力ウインチ共

混凝土巻揚用

高さ80尺昇降塔 2本 15馬力ウインチ共

橋脚1號及2號附近に各1本宛設置 2號

附近のものは本年5月一時撤去、混凝土

巻場用

高さ50尺移動 1本 15馬力ウインチ共


昇降塔 6號橋脚より2號橋臺間軌條土を移動、

混凝土巻揚用

ポンプ 3吋ホース 動力 3馬力

混凝土用水供給用

其他雜用ポンプ手巻ウインチ等小機具あれ

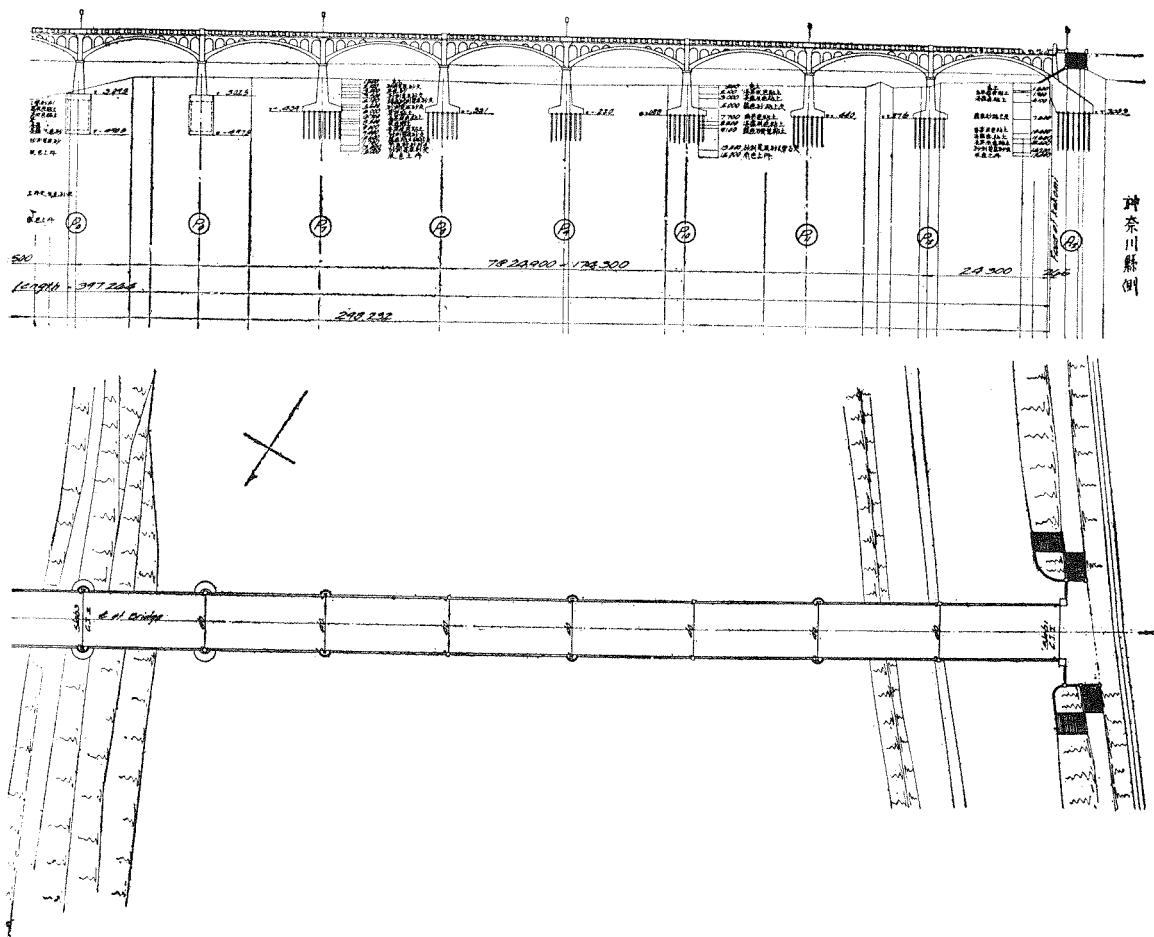

共重なるものを記し省略す。

(3) 丸子橋設計概要

架設位置及路線名

(指定府縣道第五號 東京線)
神奈川線)

東京市大森區田園調布町

神奈川縣川崎市上丸子町 入會多摩川に架す

橋梁長及巾員 橋長 397.3 米 有効巾 11.0 米
橋型

低水敷 3 徑間 徑間約 40 米 3 鋼繫拱橋

洪水敷 10 徑間 徑間約 25 米 鐵筋混泥土拱橋
基礎工 橋臺 2 基何れも杭打基礎とす。

橋脚は第一號より第六號に至る 6 基を井筒

基礎とし第七號より第拾貳號に至る 6 基は
杭打基礎とす。


橋梁縦断及横断勾配 縦断勾配は約 270 分の

1 の抛物線勾配にして取付道路が目蒲電鐵
軌道と立體交叉をなす關係並に河心東京府
寄に偏倚せる爲め片勾配とす。


横断勾配は 60 分の 1 抛物線勾配とす。

路床及高欄 路床及高欄共鐵筋混泥土造にし
て路床は厚 6 級のソリデチット鋪装を施し
高欄は花崗石様人造洗出仕上とす。


橋面照明設備 橋長約 50 米毎に橋側兩側に燈
柱 1 基宛を建設し橋面照明となし交通の安
全を圖る事とせり。

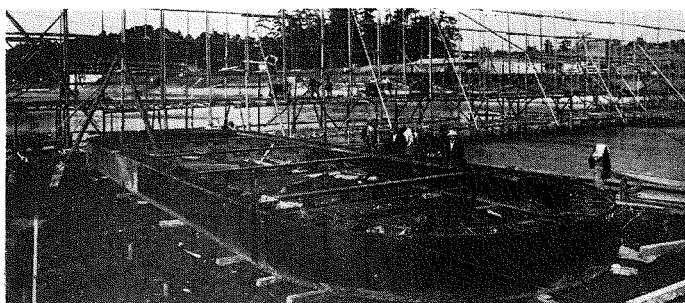


(2) 第3號橋脚井筒鐵骨据付
狀況。

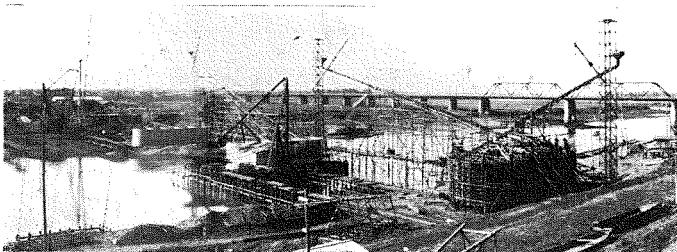

(3) 東京側より見たる井筒
混凝土作業並に掘鑿沈下作業

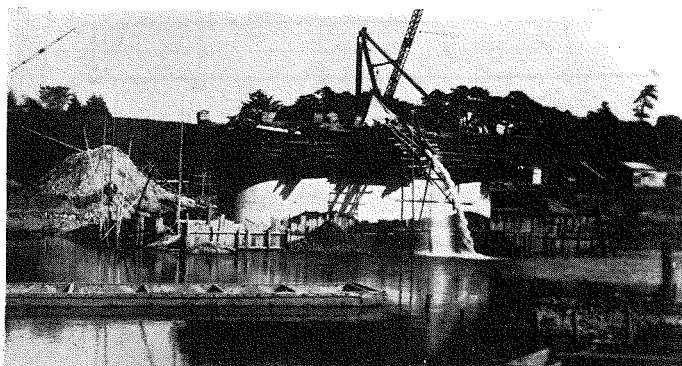


(4) 2號橋脚井筒掘鑿沈下作
業實況。



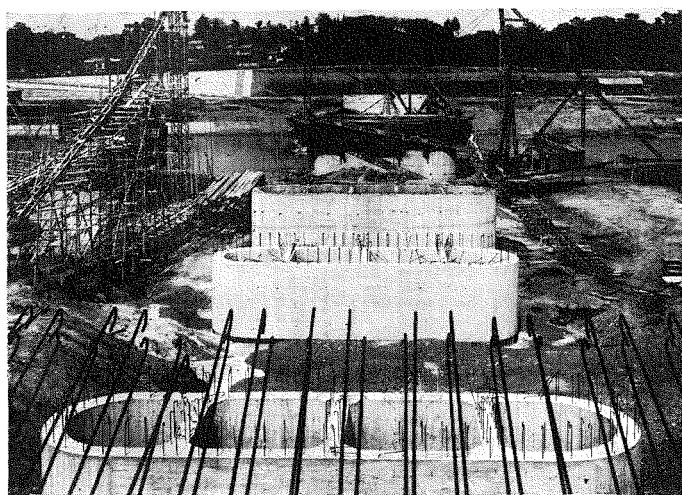


(5) 神奈川縣寄路床上より見
たる井筒掘鑿沈下實況。

(6) 神奈川縣寄洪水敷鐵筋混
凝土拱支保工組立作業。

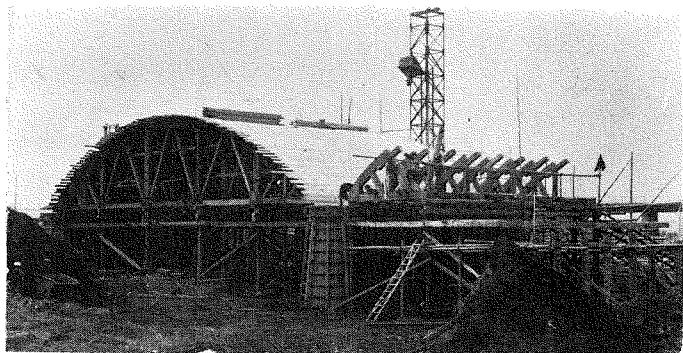


(7) 同上、鐵筋混凝土拱鐵筋
組立並に混擬土作業。

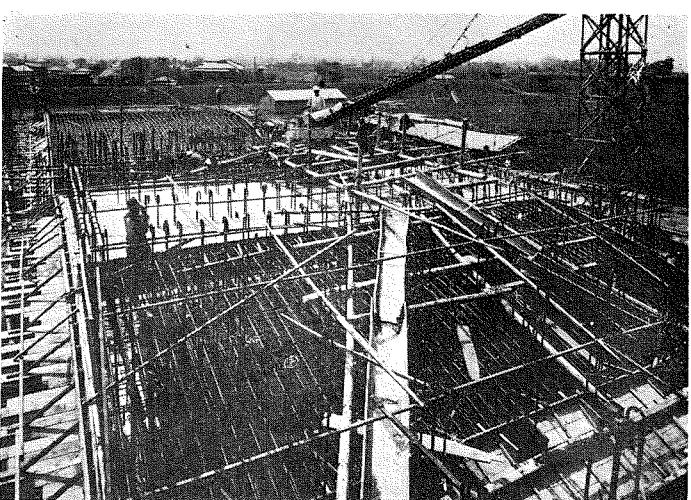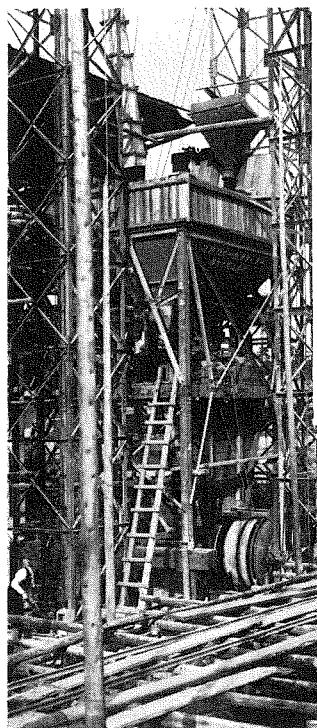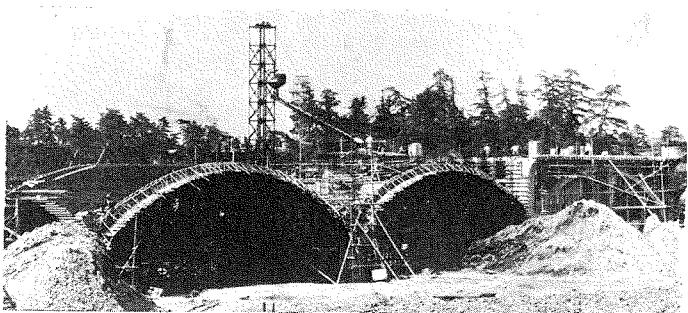


(8) 同上 配筋並に混擬土施工狀況。


←
(9) 混擬土混練設備 (ウォーセクリーター)。

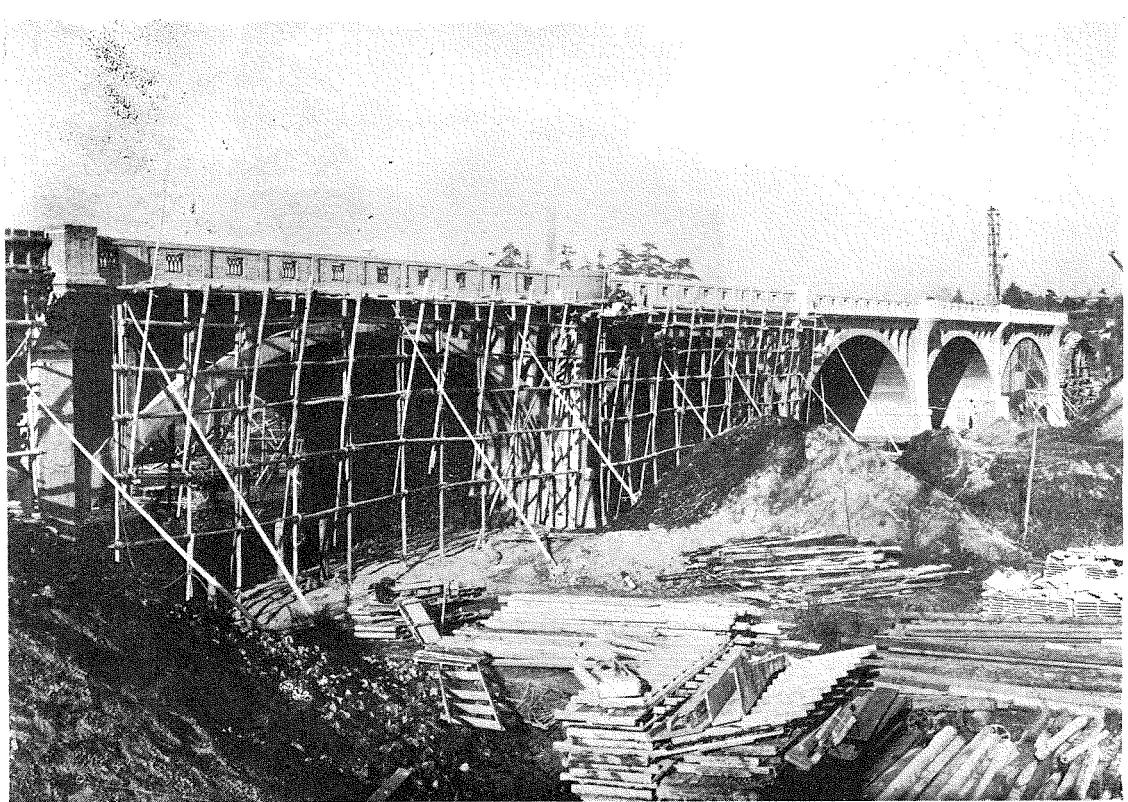


(10) 丸子橋工事近況、混泥土拱竣工部分。

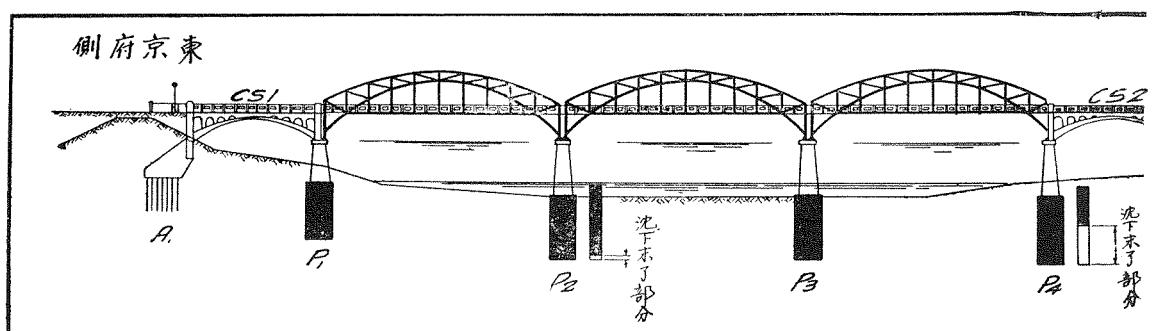

(12) 丸子橋上下部工事工程一覽圖。

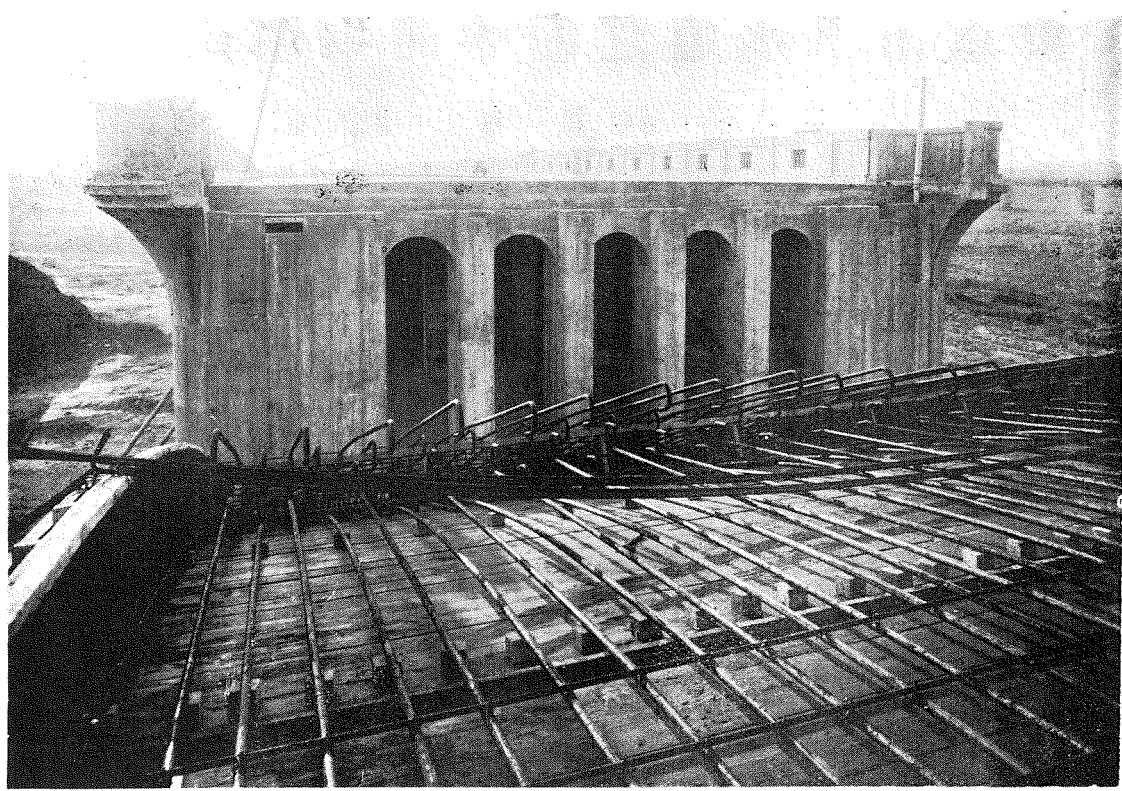

(11) 東京側より神奈川寄混凝土拱築部分を望む。

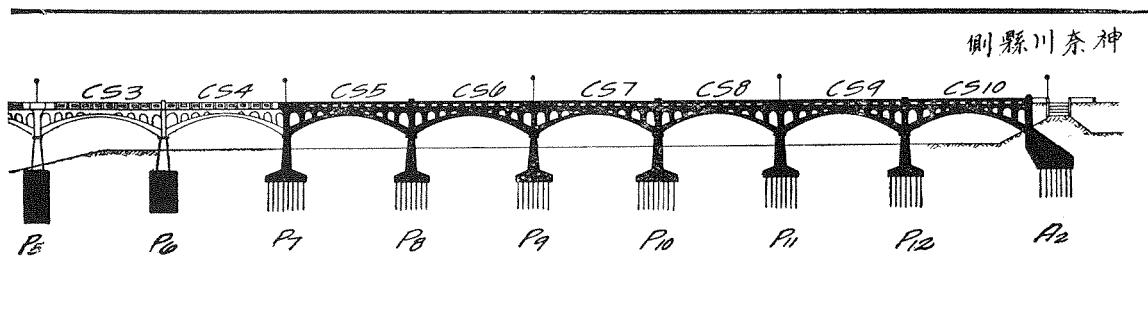

昭和八年十一月現在、黒線完了部。
