

## 朝鮮線建設及改良工事概況

### 建設工事概況

一 咸鏡線ハ延長約三百七十六哩四分ノ線路ニシテ内南部元山永興間三十三哩九分北部清津會寧間五十八哩一分ハ大正六年度マデニ營業ヲ開始シ翌七年度ニ入りテハ南部並ニ中部ノ三方面ヨリ工事ニ着手シ内永興咸興間四十三哩一分、輸城羅南間九哩三分ハ八年十二月羅南鏡城間五哩一分ハ九年十月孰レモ營業ヲ開始シ引續キ該營業區間ノ殘工事並ニ殘區間ノ工事ヲ施工又ハ計畫シ居レルモノニテ概況左ノ如シ

(イ) 南部ニアリテハ九年度ニ於テ元山永興間假橋改築ニ着手シ(十一年度完了ノ豫定)又西湖津迂回線ノ改測ヲ了シ本年度ニ於

テハ咸興退潮間(二十二哩三分)線路建設工事ニ着手ノ豫定ニテ目下準備中

(ロ) 中部ニアリテハ八年度着手ニ係ル城津日新間(十二哩三分)線路建設工事ハ目下着々進行中ニシテ大體十年度末又ハ十一年初頭ニ於テ竣工ノ豫定

(ハ) 北部ニアリテハ八年度着手ノ鏡城朱乙間(七哩六分)ハ目下順調ニ進行中ニテ本年十一月開通ノ豫定ナルガ尙古茂山蒼坪間假橋改築並ニ勾配變更(1.50ヲ1.80ニ)工事等ヲ本年度ニ於テ起工ノ豫定ニテ目下準備中ナリ

(ニ) 尙咸鏡線工事未着手區間中南部遮湖中興間(約三十九哩二分)ヲ除キ其他ハ總テ實測ヲ完了シ居ルモノナリ

二 湖南線ニアリテハ殘工事ニシテ八年度ヨリ繼續施行中ナル大田驛地下道新設其他芙蓉、四街里、豆溪、古幕院、松汀里、鶴橋驛等ニ於ケル諸設備ノ改増築又ハ構内線路模樣替驛舍新築等ノ工事ハ九年度ニ於テ其大部分ヲ竣成シ尙九年度ヨリ繼續施行中ノ各橋梁假桁架換工事ハ十年度ニ於テ全部本桁ニ架換ヲ了スル豫定ナリ

- 三 京元線ニアリテハ殘工事中、洗浦、高山、釋王寺、福溪、各驛ニ於テ諸設備ノ改増築又ハ構内線路一部模様替等ハ九年度ニ於テ其大部分ヲ竣成シ德亭、大光里驛々舎其他新築等ハ本年度ニ於テ完了ノ豫定ナルガ尙本年度ヨリハ鐵
- 二 原、福溪、釋王寺等ニ於ケル給水器改築其他ヲ順次施工ノ豫定トス
- 四 平壤炭礦線(美林勝湖里間七哩二分)ハ小野田せめんと製造株式會社布設ノ專用線ヲ買收シタルモノニシテ美林驛々舎新築其他工事並ニ南江一部鋼桁架渡工事等ハ既ニ竣成シ尙本年度ニ於テハ勝湖里驛新設工事ニ着手ノ豫定ナリ
- 五 鎮海線ハ馬山線昌原ニ起リ鎮海ニ達スル延長約十三哩ノ線路ニシテ九年度ニ於テ實測ヲ了シ本年度ニ於テハ長福山隧道前後(約二哩)ヲ起工ノ豫定ニテ目下準備中ナリ
- 六 既設鐵道旅館(釜山、京城、新義州)ノ外更ニ平壤鐵道旅館建設ノ豫定ナルモ未ダ實施ノ運ニ至ラズ
- 改 良 工 事 概 況**
- 大正三年度ヨリ繼續施行中ノ第一期計畫ニ屬スル改良工事即チ大邱若木間(八哩二分)若木金泉間(二十哩四分)金泉永同間(二十三哩九分)永同汝川間(十三哩一分)沃川大田間(九哩二分)大田芙江間(十三哩五分)及京城附近工事ノ一部ハ孰レモ八年度マデニ竣功シ九年度以降ハ主トシテ七年度起工ノ第二期計畫工事並ニ九年度着手ノ新規計畫工事ヲ施行シ居ルモノニシテ概況左ノ如シ
- 一 京釜線大邱芙江間改良殘工事ハ前年度以來引續キ順次施行シ本年度ニ於テハ驛舎及給水器等ノ改築並ニ信號所新築避難線増設等ニ着手シ一部ハ竣成ヲ告ゲタルモ大部分ハ尙施行中ナリ
- 二 同線清道慶山間線路改良工事ハ八年度ヨリ繼續施行中ニシテ目下順調ニ進涉中ナルガ就中難工事ニシテ且ツ朝鮮線最長ノ隧道ナル省峴隧道七千六百二十三呎ノ内南口ハ十年六月初旬ニ於テ導坑千六百十一呎北口ハ千四百九十七呎ヲ掘鑿シ居リテ本區間ノ完成ハ來ル十二年末ノ豫定ナリ
- 三 其他同線慶山大邱間、芙江天安間、馬山三浪津間等ノ線路改良工事ハ明年以後ニ於テ順次起工ノ豫定トス


- 四 草梁釜山鎮間改良工事ハ線路ヲ變更シ在來釜山鎮驛ヲ草梁釜山鎮間古館ニ移轉シ同時ニ草梁構内ノ配線其他ヲ改良スルモノニシテ七年度起工九年十月新驛ヲ開業ヲナシタルモノナルガ尙引續キ本區間ノ諸設備其他ヲ施行スル豫定ナリ
- 五 龍山構内ニアリテハ八年度起工ニ係ル石炭臺並ニ機關庫附近軌道布設工事九年度着手ノ第二回軌道増設並ニ龍山組立工場くれーんがーだー架設工事等ハ既ニ竣成シ十年度以降ハ尙引續キ構内諸設備及線路等改良ノ計畫ナリ
- 六 京義線南大門水色間線路改良工事ハ南大門、城山里間ノ線路ヲ變更シ水色へ直通セシムルモノニシテ八年度起工九年十二月南大門水色間直通運轉ヲ開始シタルガ十年度ニ於テハ新村停車場本屋其他ヲ起工目下施行中ナリ
- 七 南大門驛構内改良ハ八、九兩年度ニ於テ地盤其他ノ土工工事ノ大部分ヲ完成シ十年度ヨリハ引續キ線路模様換ヲナシ且ツ驛本屋改築ニ着手シ十三年度ニ於テ全部完成ノ豫定トス
- 八 平壤炭礦線改良工事ハ八年度起工大同江信號所寺洞間線路一部ヲ變更シ平壤市ト大同江ヲ隔ツル船橋里ニ停車場ヲ設ケタルモノナルガ驛本屋其他ハ九年度ニ於テ完成、本年度ニ於テハ寺洞停車場ノ配線及本屋等ノ改築ヲナスモノトス
- 九 枕木増設工事ハ列車運轉上ノ安全ヲ期スル爲メ施行スルモノニシテ九、十兩年度ニ於テ京釜(京仁線ヲ含ム)京義本線ノ曲線箇所ニ對シ三十三軌條一本ニ付一挺乃至二挺ヲ増設シ尙引續キ十一年度ヨリ同線直線部並ニ京元線其他ニモ増設ノ豫定ナリ
- 十 其他京義線黃州兼二浦間線路改良ノ豫定ナルモ起工期其他ハ未定トス

(完)

# 朝鮮鐵道圖

縮尺五百一十分之一

(大正十一年六月現在)

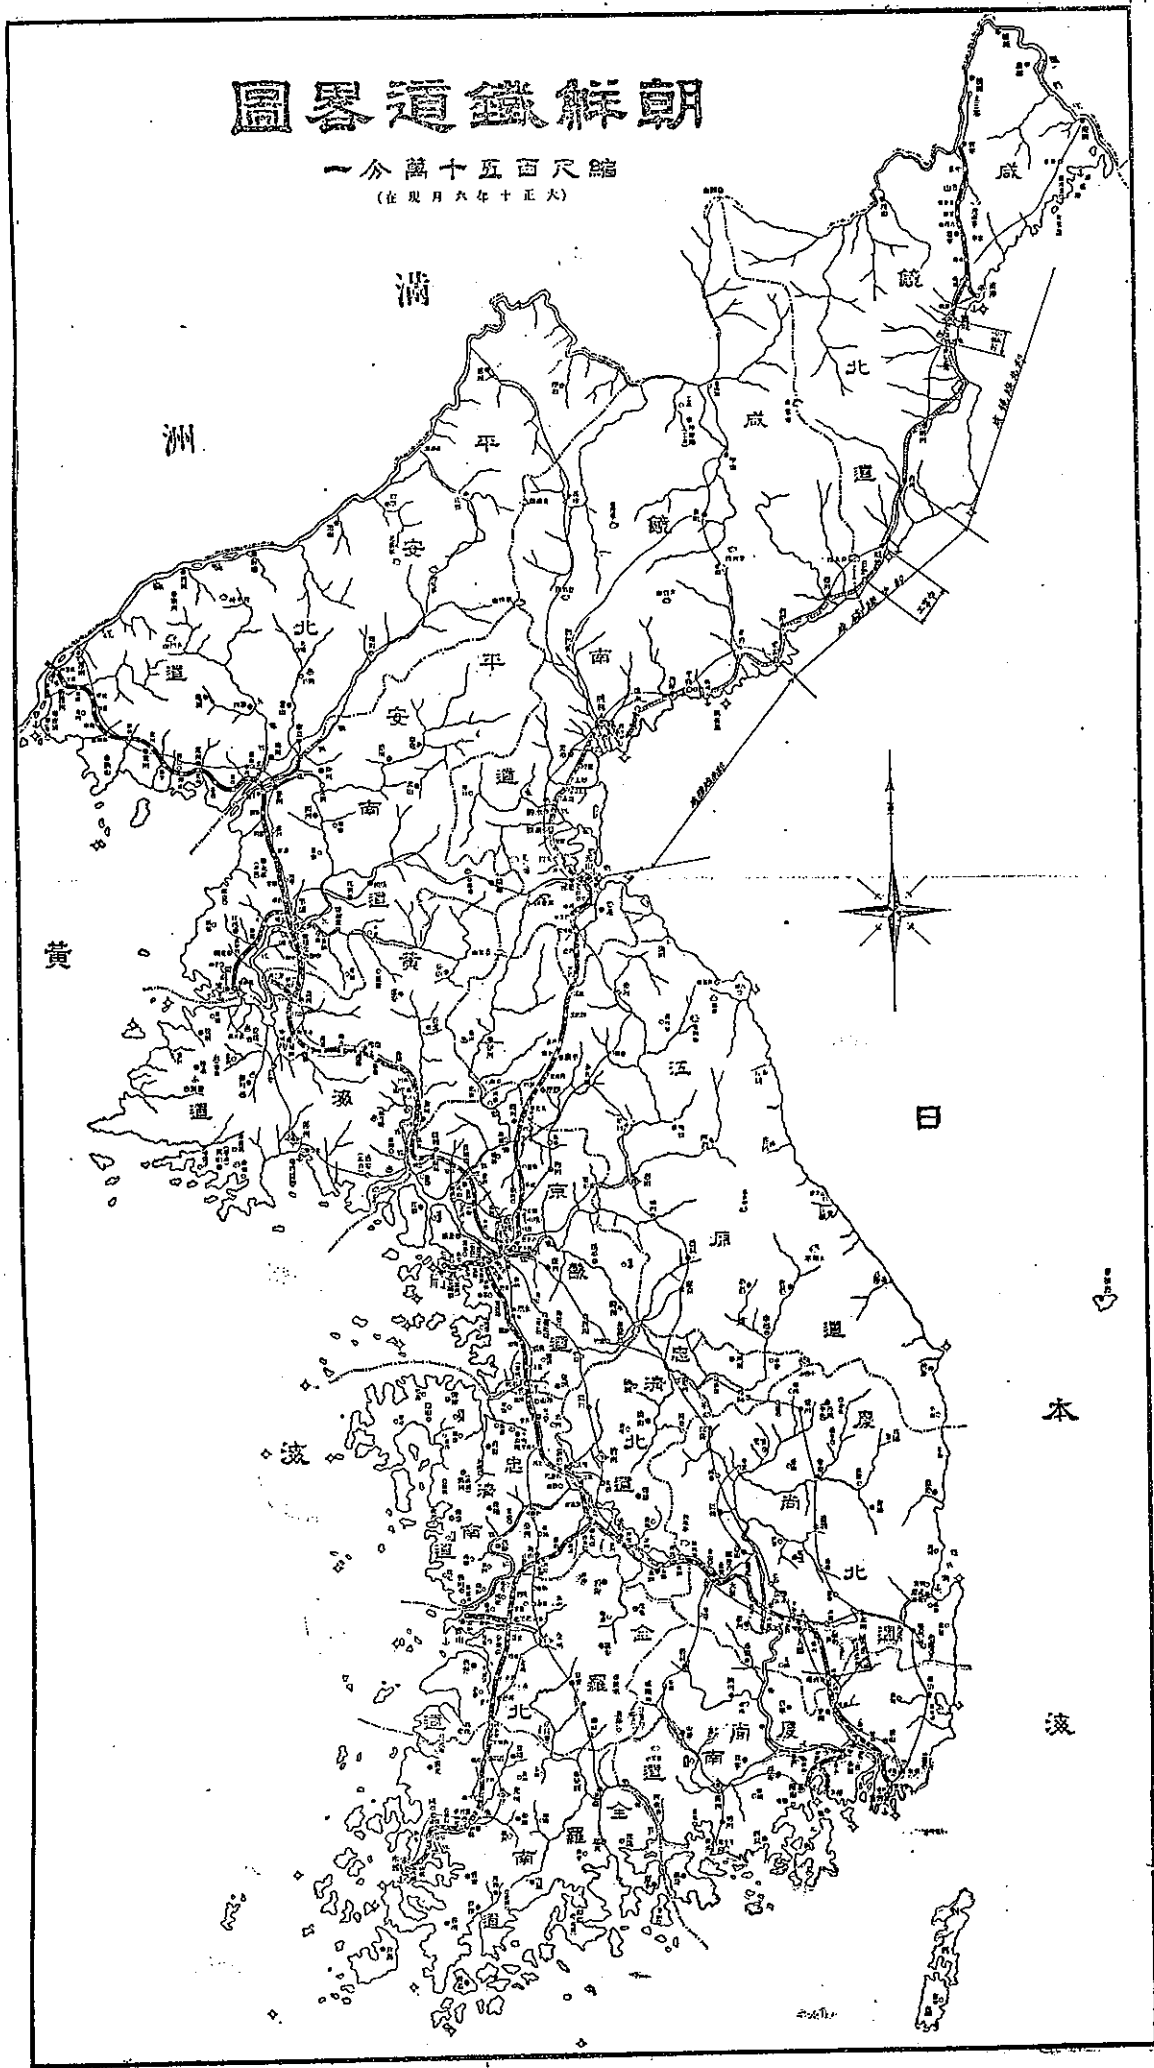

### 朝鮮鐵道線路延長總表

線名	營業		哩程	
	區間	間	哩程	哩程
京釜本線	京山	釜山	142.3	537.7
馬山線	京山	馬山	24.6	214.8
京仁線	京山	仁川	18.3	156.0
京義本線	京山	義州	210.4	578.0
旅二浦線	京山	旅順	8.1	62.7
平壤炭鐵線	平壤	炭鐵	15.8	115.9
平南線	平壤	南浦	34.2	243.3
新義州接板橋線	新義州	板橋	1.1	1.1
湖南線	平壤	湖南	16.1	132.8
蔚山線	蔚山	蔚山	14.2	14.3
京元線	京山	元山	158.2	438.5
咸鏡線(南)	咸鏡南	咸鏡南	3.7	27.9
咸鏡線(北)	咸鏡北	咸鏡北	3.8	40.1
合(全)			147.5	747.4
合計			1714.3	5057.1

### 改良區間哩程

線名	工中		工未着手	
	區間	哩程	區間	哩程
京釜線	京山	10.4	6.5	81.0
	馬山	3.3	3.1	89.9
	蔚山	11.3	2.4	50.1
京義線	京山	5.4	7.3	
合計		33.5	23.1	64.7

### 建設區間哩程

線名	工中		工未着手	
	區間	哩程	區間	哩程
咸鏡線	咸鏡南	12.2	0.0	0.0
	咸鏡北	7.6	0.0	0.0
濱海線	平壤	12.7	7.7	0.0
合計		32.5	7.7	0.0

例 凡

鐵道線路  
 鐵道中斷線  
 鐵道未着手區間  
 鐵道改良區間  
 鐵道建設區間  
 鐵道改裝區間  
 鐵道廢止區間  
 鐵道未廢止區間  
 鐵道未改裝區間  
 鐵道未建設區間  
 鐵道未改良區間  
 鐵道未廢止區間

鐵道改良區間  
 鐵道建設區間  
 鐵道改裝區間  
 鐵道廢止區間  
 鐵道未廢止區間

鐵道改良區間  
 鐵道建設區間  
 鐵道改裝區間  
 鐵道廢止區間  
 鐵道未廢止區間

鐵道改良區間  
 鐵道建設區間  
 鐵道改裝區間  
 鐵道廢止區間  
 鐵道未廢止區間

朝鮮鐵道總局編製
