

昭和十一年十一月

岐阜國道改良工事概要

內務省名古屋土木出張所

岐阜國道改良工事概要

一、工 事 名

岐阜國道改良工事

二、事業名及工事竣功額 (昭和十一年十一月現在)

昭和七年度	産業開發事業	二四九、九七〇*
昭和八年度	時局匡救事業	二四九、九三六
昭和九年度	同上	一四九、九八一
昭和十年度	國道改良事業	一九五、三四六
計		八四五、二二三
		六、四三四・六五

三、事業區域

岐阜縣羽島郡柳津村・笠松町
同 縣稻葉郡茜部村・厚見村・加納町
岐阜市

四、路 線 名

十二號路線	自 岐阜縣羽島郡柳津村大池 至 同 縣稻葉郡加納町安良町	四、二四七・〇〇*
八號路線	自 同 縣同 郡同 町新本町四丁目 至 同 縣同 郡同 町富士町	一、八二〇・〇〇
十三號路線	自 同 縣同 郡同 町富士町	三六七・六五

五、延長及幅員

(イ) 延長	六、四三四・六五米	内 (橋道) 六、三三二・八一米
(ロ) 幅員	一一米	四、一〇〇・〇〇*
	一五	一、九六七・〇〇 (一、四七〇・〇〇*)
	二〇	一、八二〇・〇〇*
		八號 路 線 上
		十三號 路 線

六、舗 裝

種 類	延 長	面 積	摘 要
車道 混 凝 土 舗 裝	六、三三二・八一*	四七、五〇一・〇〇*	二層式厚一五糎乃至一七糎
歩道 混 凝 土 舗 裝	一、六〇〇・五〇	四、八〇五・〇〇	厚 六 糎
歩道 混 凝 土 ブロック 舗 裝	二、〇九四・七五	一一、二二六・〇〇	厚 五 糎
歩道 アスファルト モルタル 舗 裝	二、四四四・四〇	一一、二二二・〇〇	基礎混凝土六糎 表層一八糎
歩道 アスファルト 乳劑 舗 裝	一、六〇〇・五〇	三、二〇一・〇〇	基礎混凝土四糎 表層二〇糎

七、橋 梁

橋 名	橋 長	幅 員	型 式
美 笠 橋	一一・六〇*	一五・〇〇*	鐵筋混凝土T型桁
境 川 橋	四四・〇〇	一一・〇〇	同 上
荒 田 橋	二六・二〇	一五・〇〇	鐵筋混凝土ラーメン式ガルバーT型桁
柳 橋	四・八四	一五・〇〇	鐵筋混凝土T型桁
杏 井 橋	一五・二〇	一五・〇〇	鐵筋混凝土ラーメン式T型桁

八、買收用地面積

總面積 七七、一五七平方米

九、使用勞働者數

總人員 一三三八、六九八人

一〇、着手及竣功


着手 昭和七年七月

竣功

昭和十一年十一月

凡例

	計	岐阜國道改良工事區間 (延長六、四三四六五米)
	國	道
	都	市
	在	來
	計	畫
	路	線

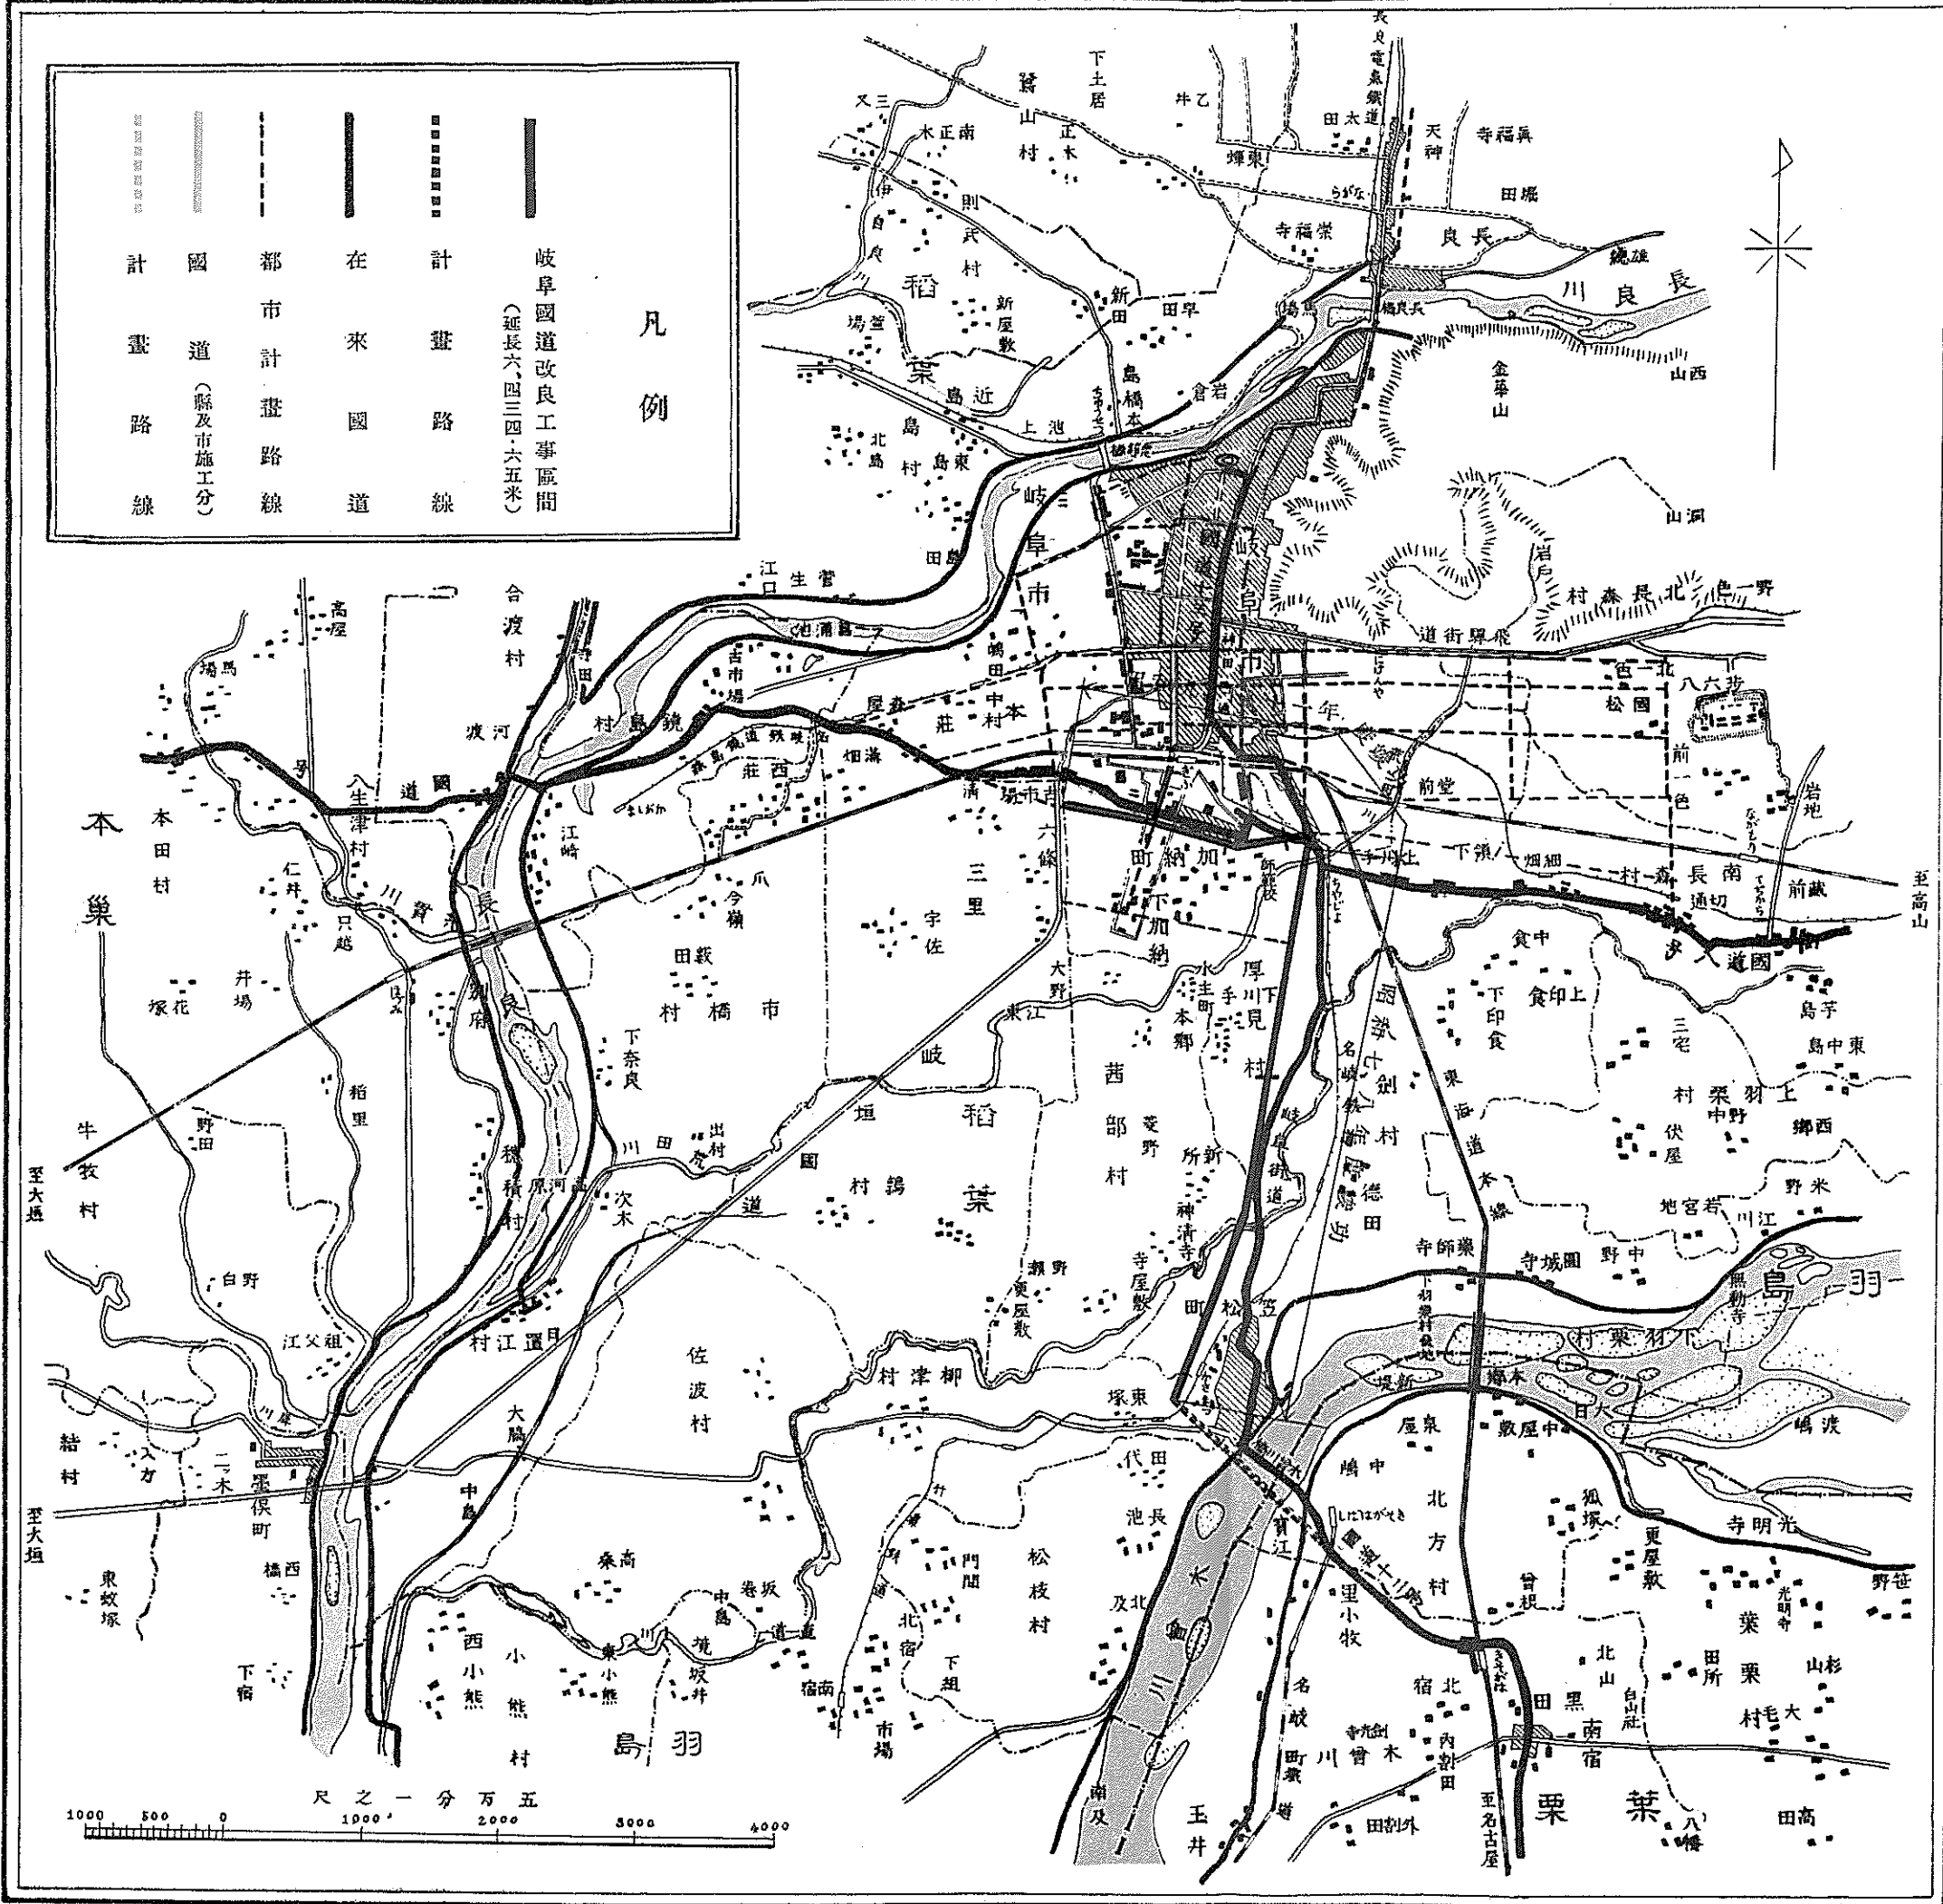

尺之一分万五
 1000 500 0 1000 2000 3000 4000
