


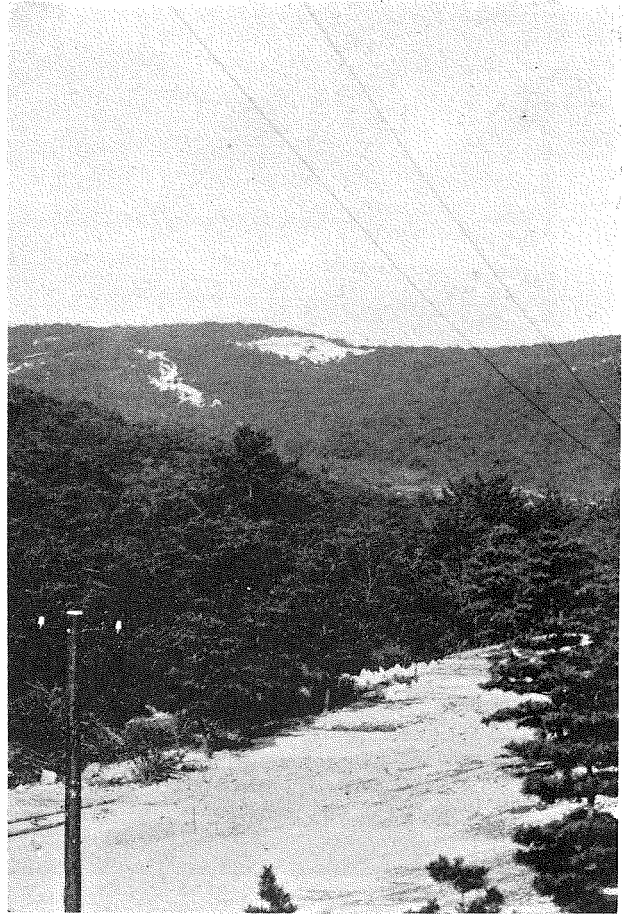

(1)

名古屋市營 八事火葬場 建築概要

名古屋市土木部長

花井又太郎

位置・愛知縣天白村大字八事字裏山

敷地面積・ 10,838.720平方米

建築面積・ 1,643.954平方米

内 譯

火葬爐本家・鐵筋コンクリート造平家建

889.719平方米

事務所・木造平家建

120.420平方米

休憩所・木造平家建

221.940平方米

渡り廊下・木造平家建

101.734平方米

自動車庫・鐵筋コンクリート造平家建

107.114平方米

火夫控室及物置・木造平家建

53.100平方米

火火住宅・木造平家建

58.677平方米



名古屋市営八事火葬場全景。

斃獸焼却所・木造平家建	16,200平方米
其 他・	75,050平方米
工 費・	171,944.10圓
工 程・起工	昭和8年7月7日
竣功	昭和10年10月31日
火葬爐・(イ)重油火葬爐	15基
内	
寢 棺 爐	5基
座 棺 爐	10基
(ロ)石炭火葬爐	15基
内	
寢 棺 爐	5基
座 棺 爐	8基

小 人 爐	2基
斃獸焼却場・石炭爐	1基
工事設計監督・市役所建築課	
工事請負者・株式会社 北川組	

附 記

火葬爐本家は直徑 1 米の圓形にして火葬爐を放射狀に配列す。


石 爐は防煙防臭のため逆燃焼裝置とし重油爐は音響と振動の關係を考慮し低壓「オイルバーナー」を採用せり。

休憩所は椅子式一室及疊敷三室とす。




(2) 八事火葬場本館外部。

(3) 八事火葬場配置圖。

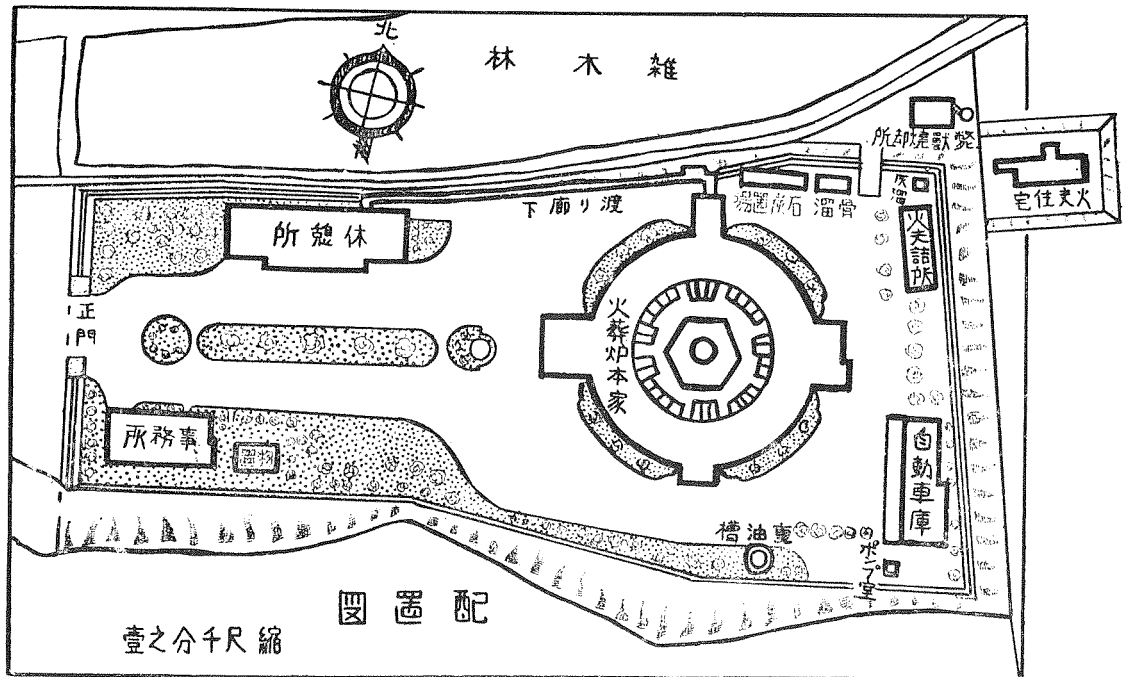



(4) 八事火葬場本館内部。

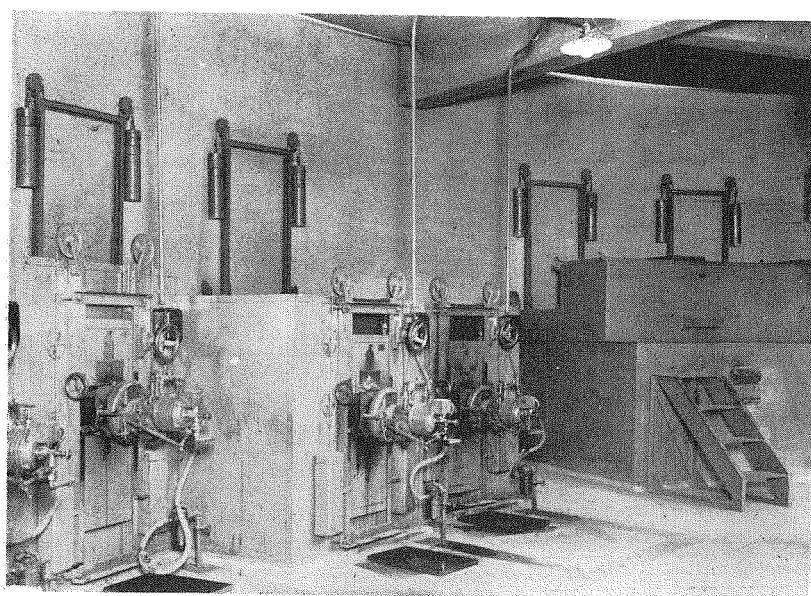

(5) 八事火葬場
作業室内部。
